


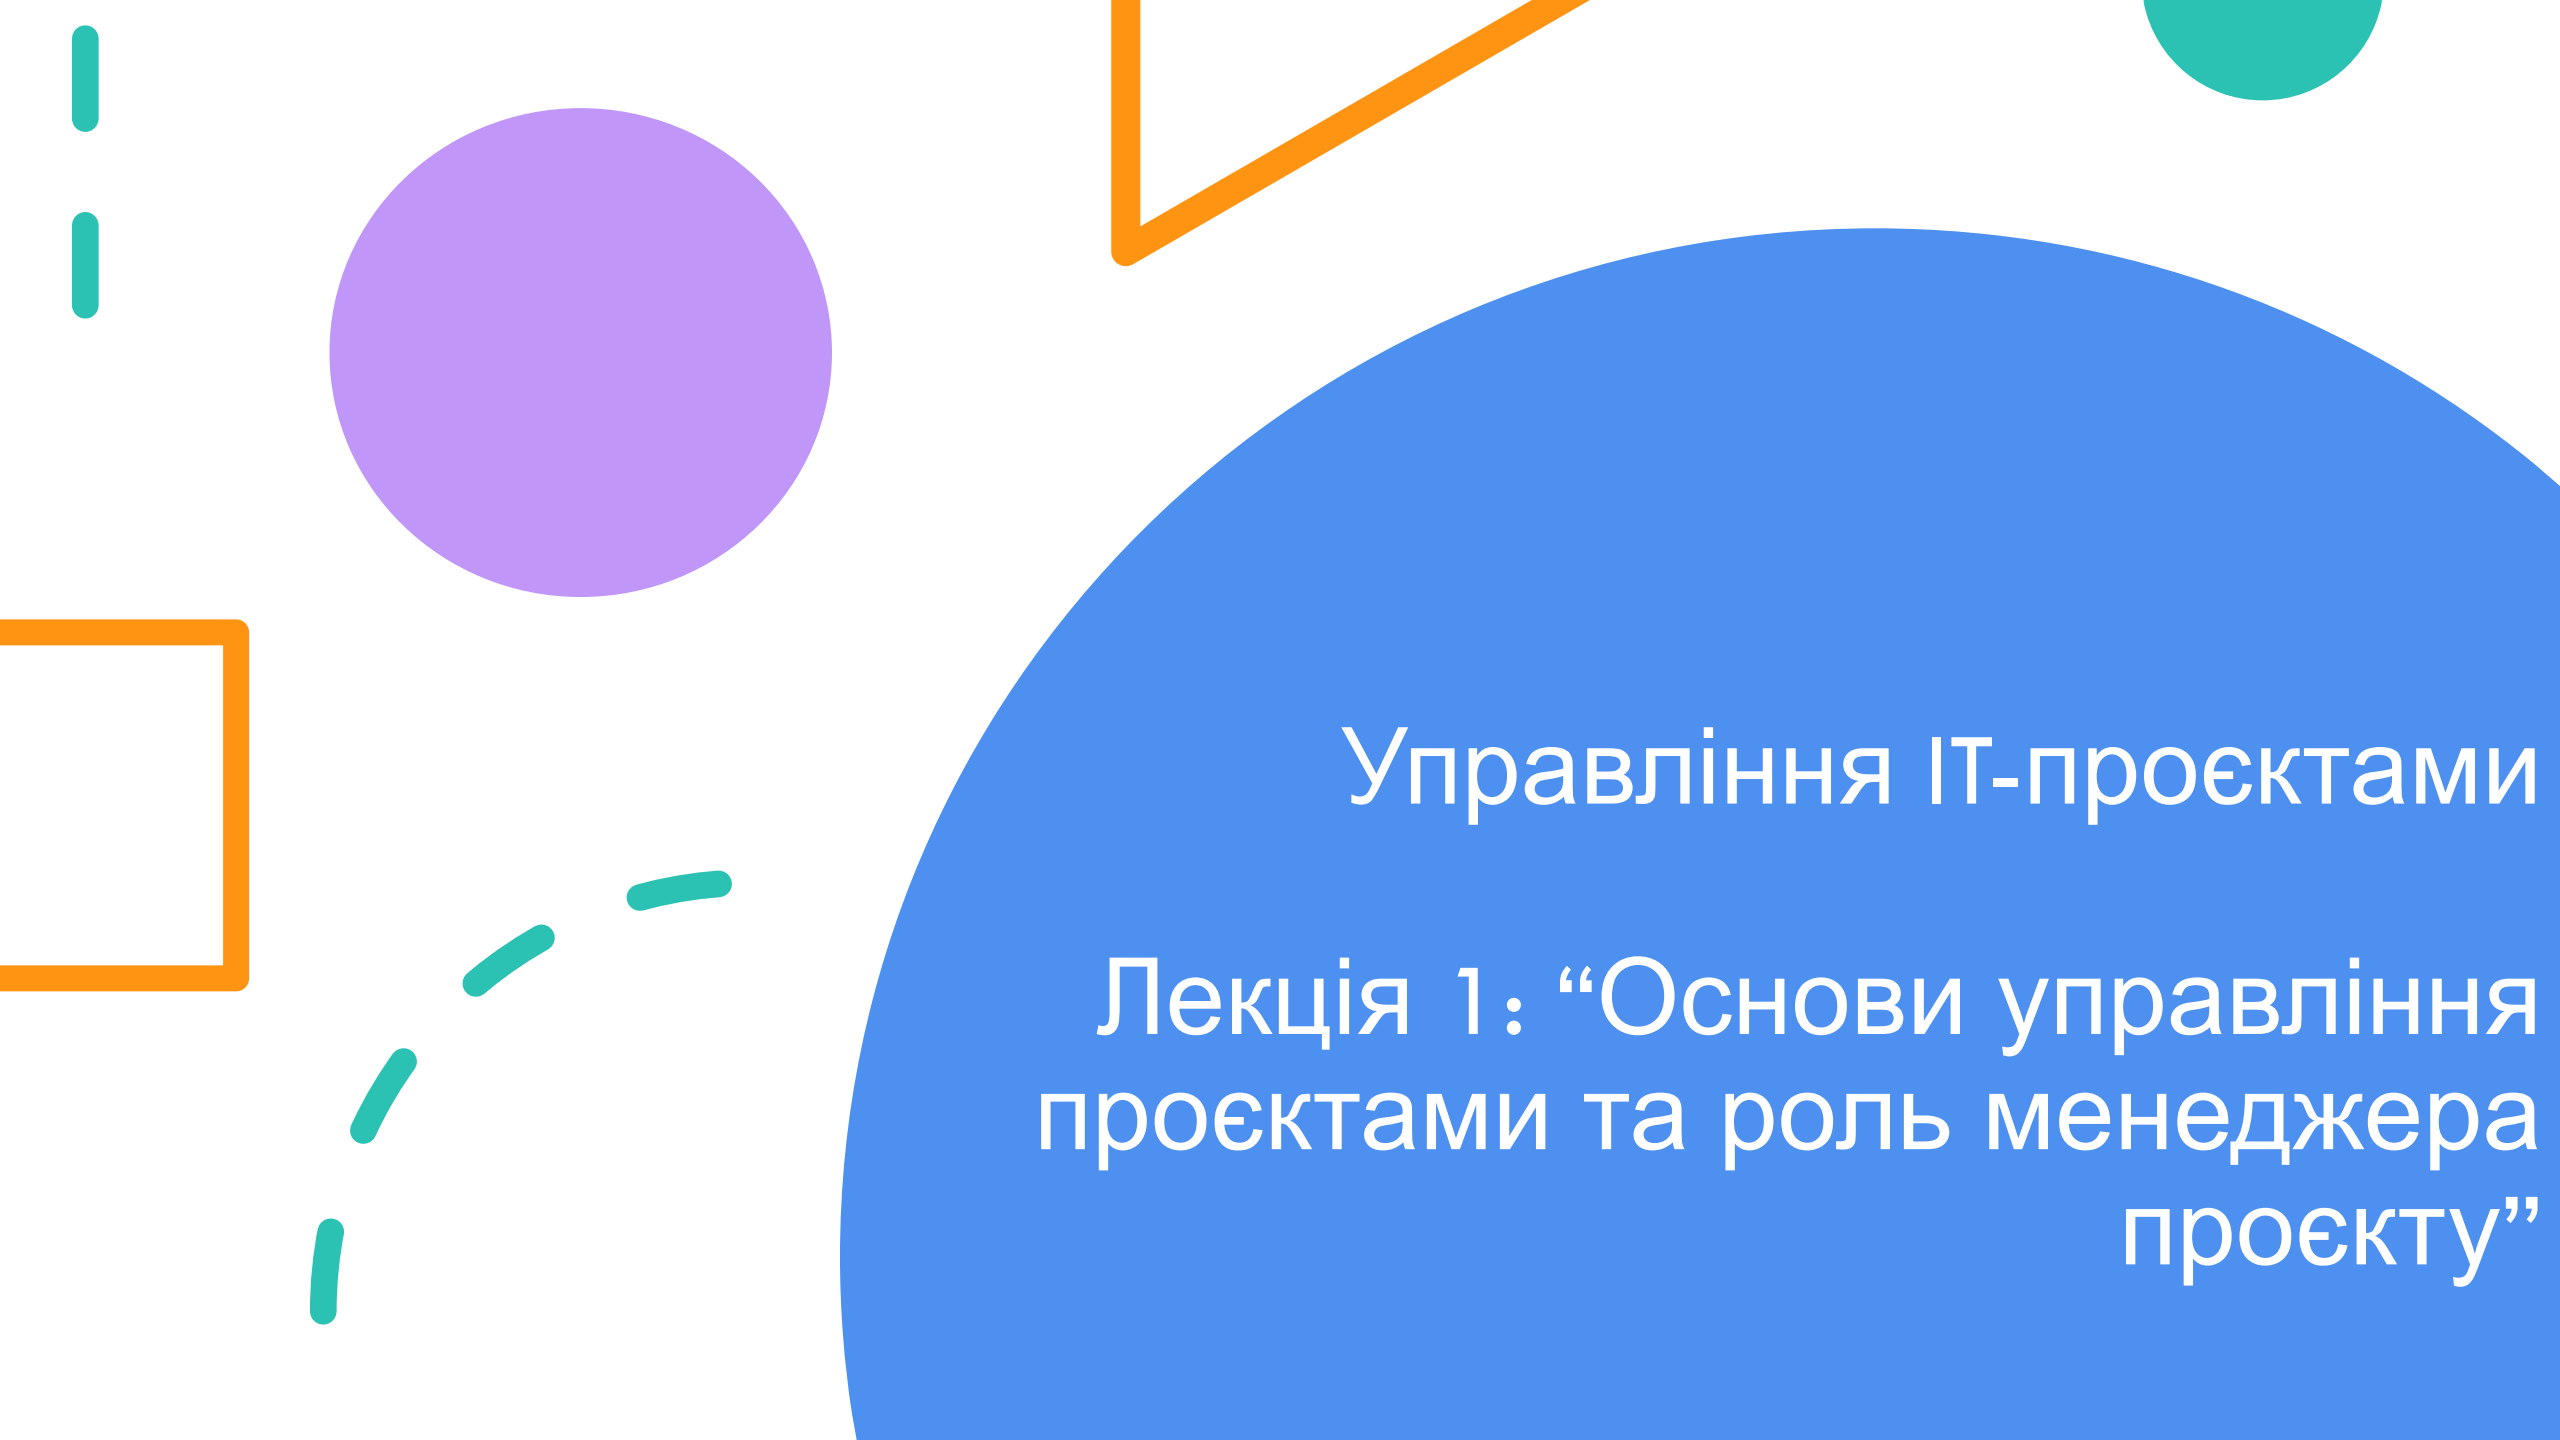

Управління ІТ-проєктами

Лекція 1: “Основи управління проєктами та роль менеджера проєкту”

Знайомство та правила курсу

Манікаєва Ольга Сергіївна

к.т.н. доцент каф. ІС

e-mail: manikaieva.o.s@op.edu.ua

Правила курсу:

1. 18 лекцій
2. 9 лабораторних робіт, які виконуються самостійно
3. Захист лабораторних робіт – обов'язковий
4. Увесь необхідний матеріал розміщується в Google Classroom після лекції або лабораторного заняття
5. Модульний контроль – 40 балів
6. Лабораторні роботи – 60 балів
7. Запис екрана лекцій, лабораторних робіт не дозволяється



Чому ІТ-проєкти стають неуспішними?

Нечіткі вимоги

Нереалістичні строки

Помилки в оцінюванні бюджету

Слабка комунікація

Відсутність управління ризиками

Неконтрольовані зміни (Scope Creep)


Що називається проєктом?

Проект – це тимчасова діяльність, спрямована на створення унікального продукту, сервісу або результату.

Ключові характеристики проєкту:


- **Тимчасовість** – проєкт має визначений початок і завершення.
- **Унікальність результату** – продукт або сервіс відрізняється від попередніх.
- **Поступове уточнення (Progressive elaboration)** – деталі проєкту уточнюються в процесі виконання.
- **Орієнтація на досягнення цілей** - проєкт спрямований на реалізацію конкретної бізнес-мети.
- **Наявність зацікавлених сторін (Stakeholders)** – існують особи або групи, на яких впливає проєкт або які впливають на нього.



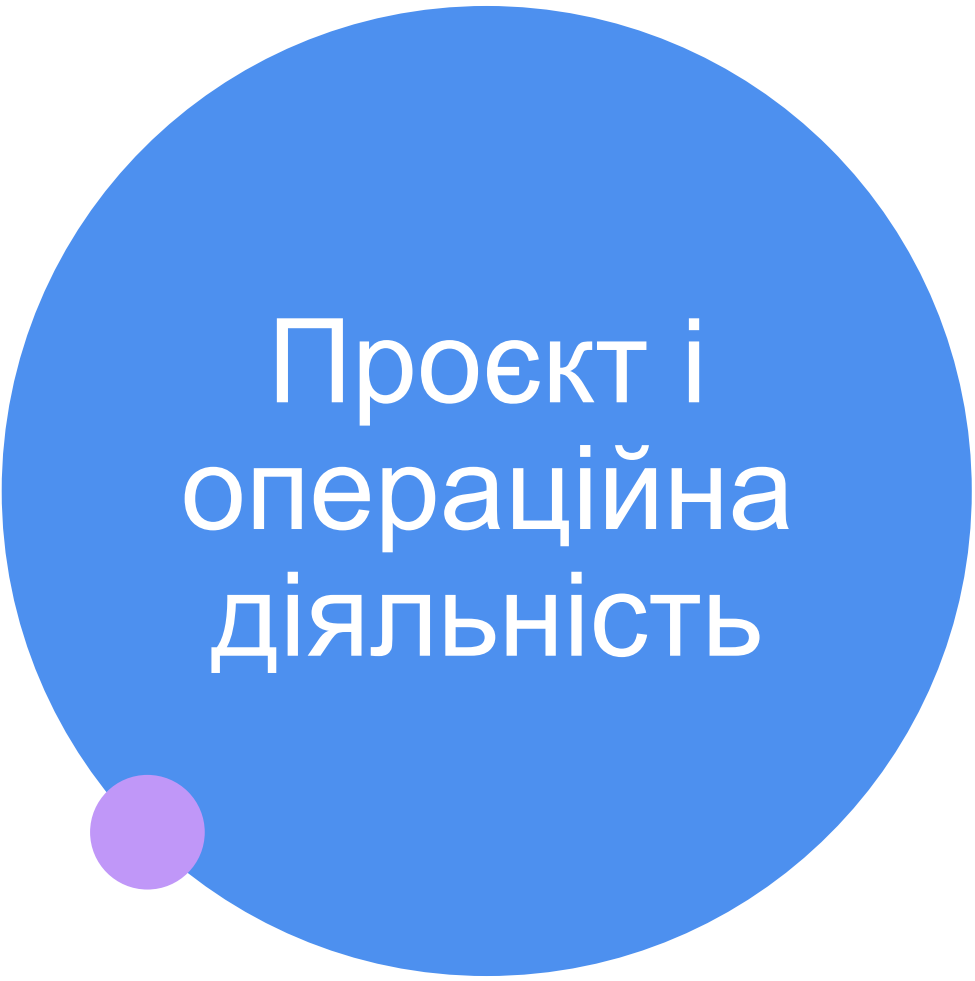

Проект і операційна діяльність

- 
- Постійна
 - Повторювана
 - Підтримує стабільність бізнесу
 - Регламентована процесами
 - Орієнтована на ефективність

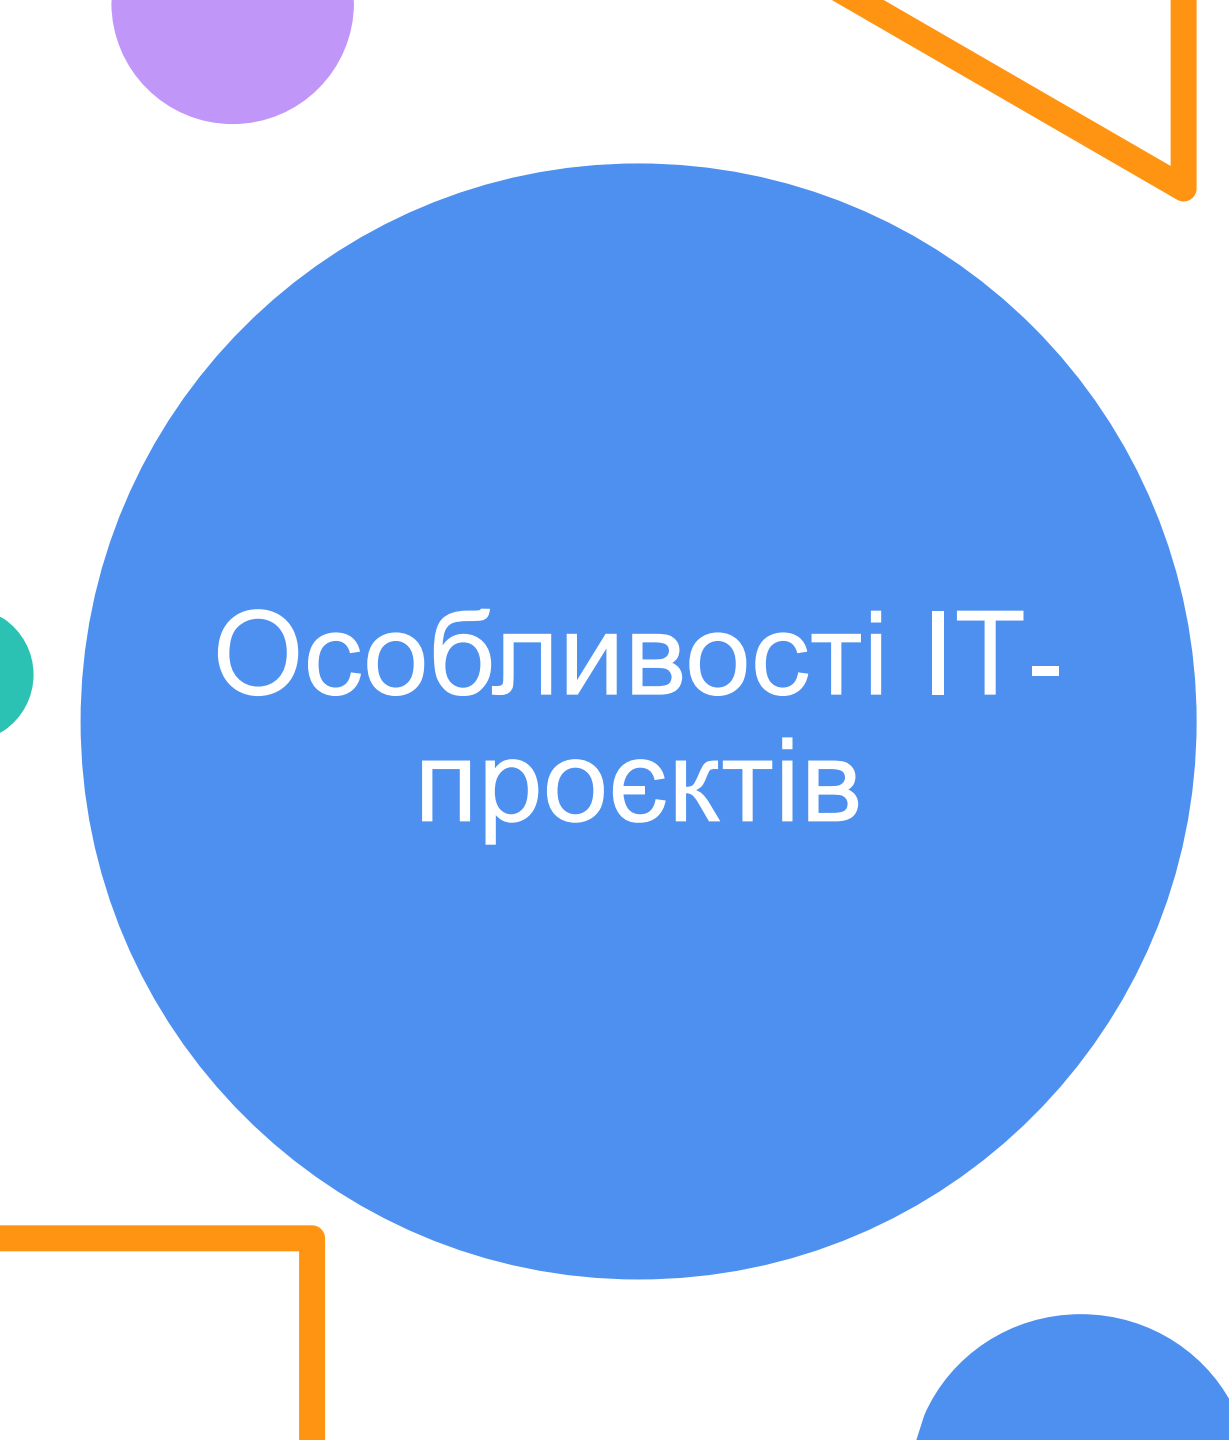

Особливості ІТ- проєктів

Висока невизначеність

Складність оцінювання

Інтелектуальний продукт

Технологічні ризики

Людський фактор

Рівень невизначеності в ІТ

Невизначеність вимог

Замовник не завжди чітко формулює очікування

Технічна невизначеність

Невідомі складність реалізації, інтеграції, продуктивність

Ринкова невизначеність

Зміна бізнес-моделі, конкуренція, зміна пріоритетів


Оціночна невизначеність

Неточність прогнозування строків та бюджету

Людська невизначеність

Продуктивність, звільнення, конфлікти, мотивація

Обмеження
проєкту: Scope –
Time – Cost

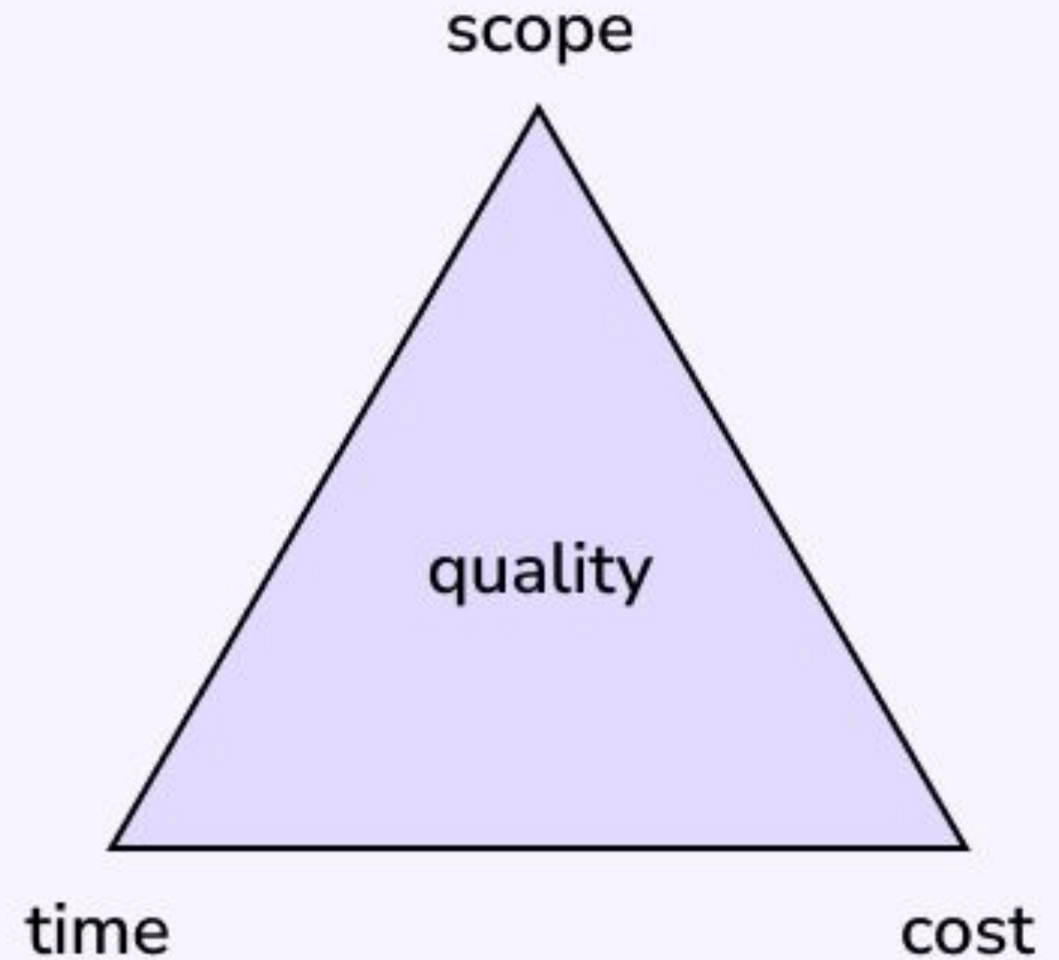

Баланс обмежень у реальному бізнесі

- Фіксований бюджет + фіксований строк → гнучкий обсяг (Score)
- Фіксований обсяг + фіксований бюджет → гнучкі строки
- Фіксований обсяг + фіксований строк → зростає бюджет

Стейкхолдери

- Стейкхолдери — це особи, групи або організації, які впливають на проєкт або перебувають під його впливом
- Замовник
- Кінцевий користувач
- Інвестор
- Керівництво компанії
- Команда розробки
- Партнери

Типи стейкхолдерів в ІТ-проєкті




Конфлікт інтересів у проєкті

- *Бізнес* → мінімізувати витрати
- *Замовник* → отримати швидко
- *Команда* → забезпечити якість
- *Інвестор* → швидкий результат
- *Користувач* → зручність і стабільність

Хто такий Project Manager?

Project Manager (PM) — це особа, відповідальна за досягнення цілей проєкту в межах визначених обмежень.



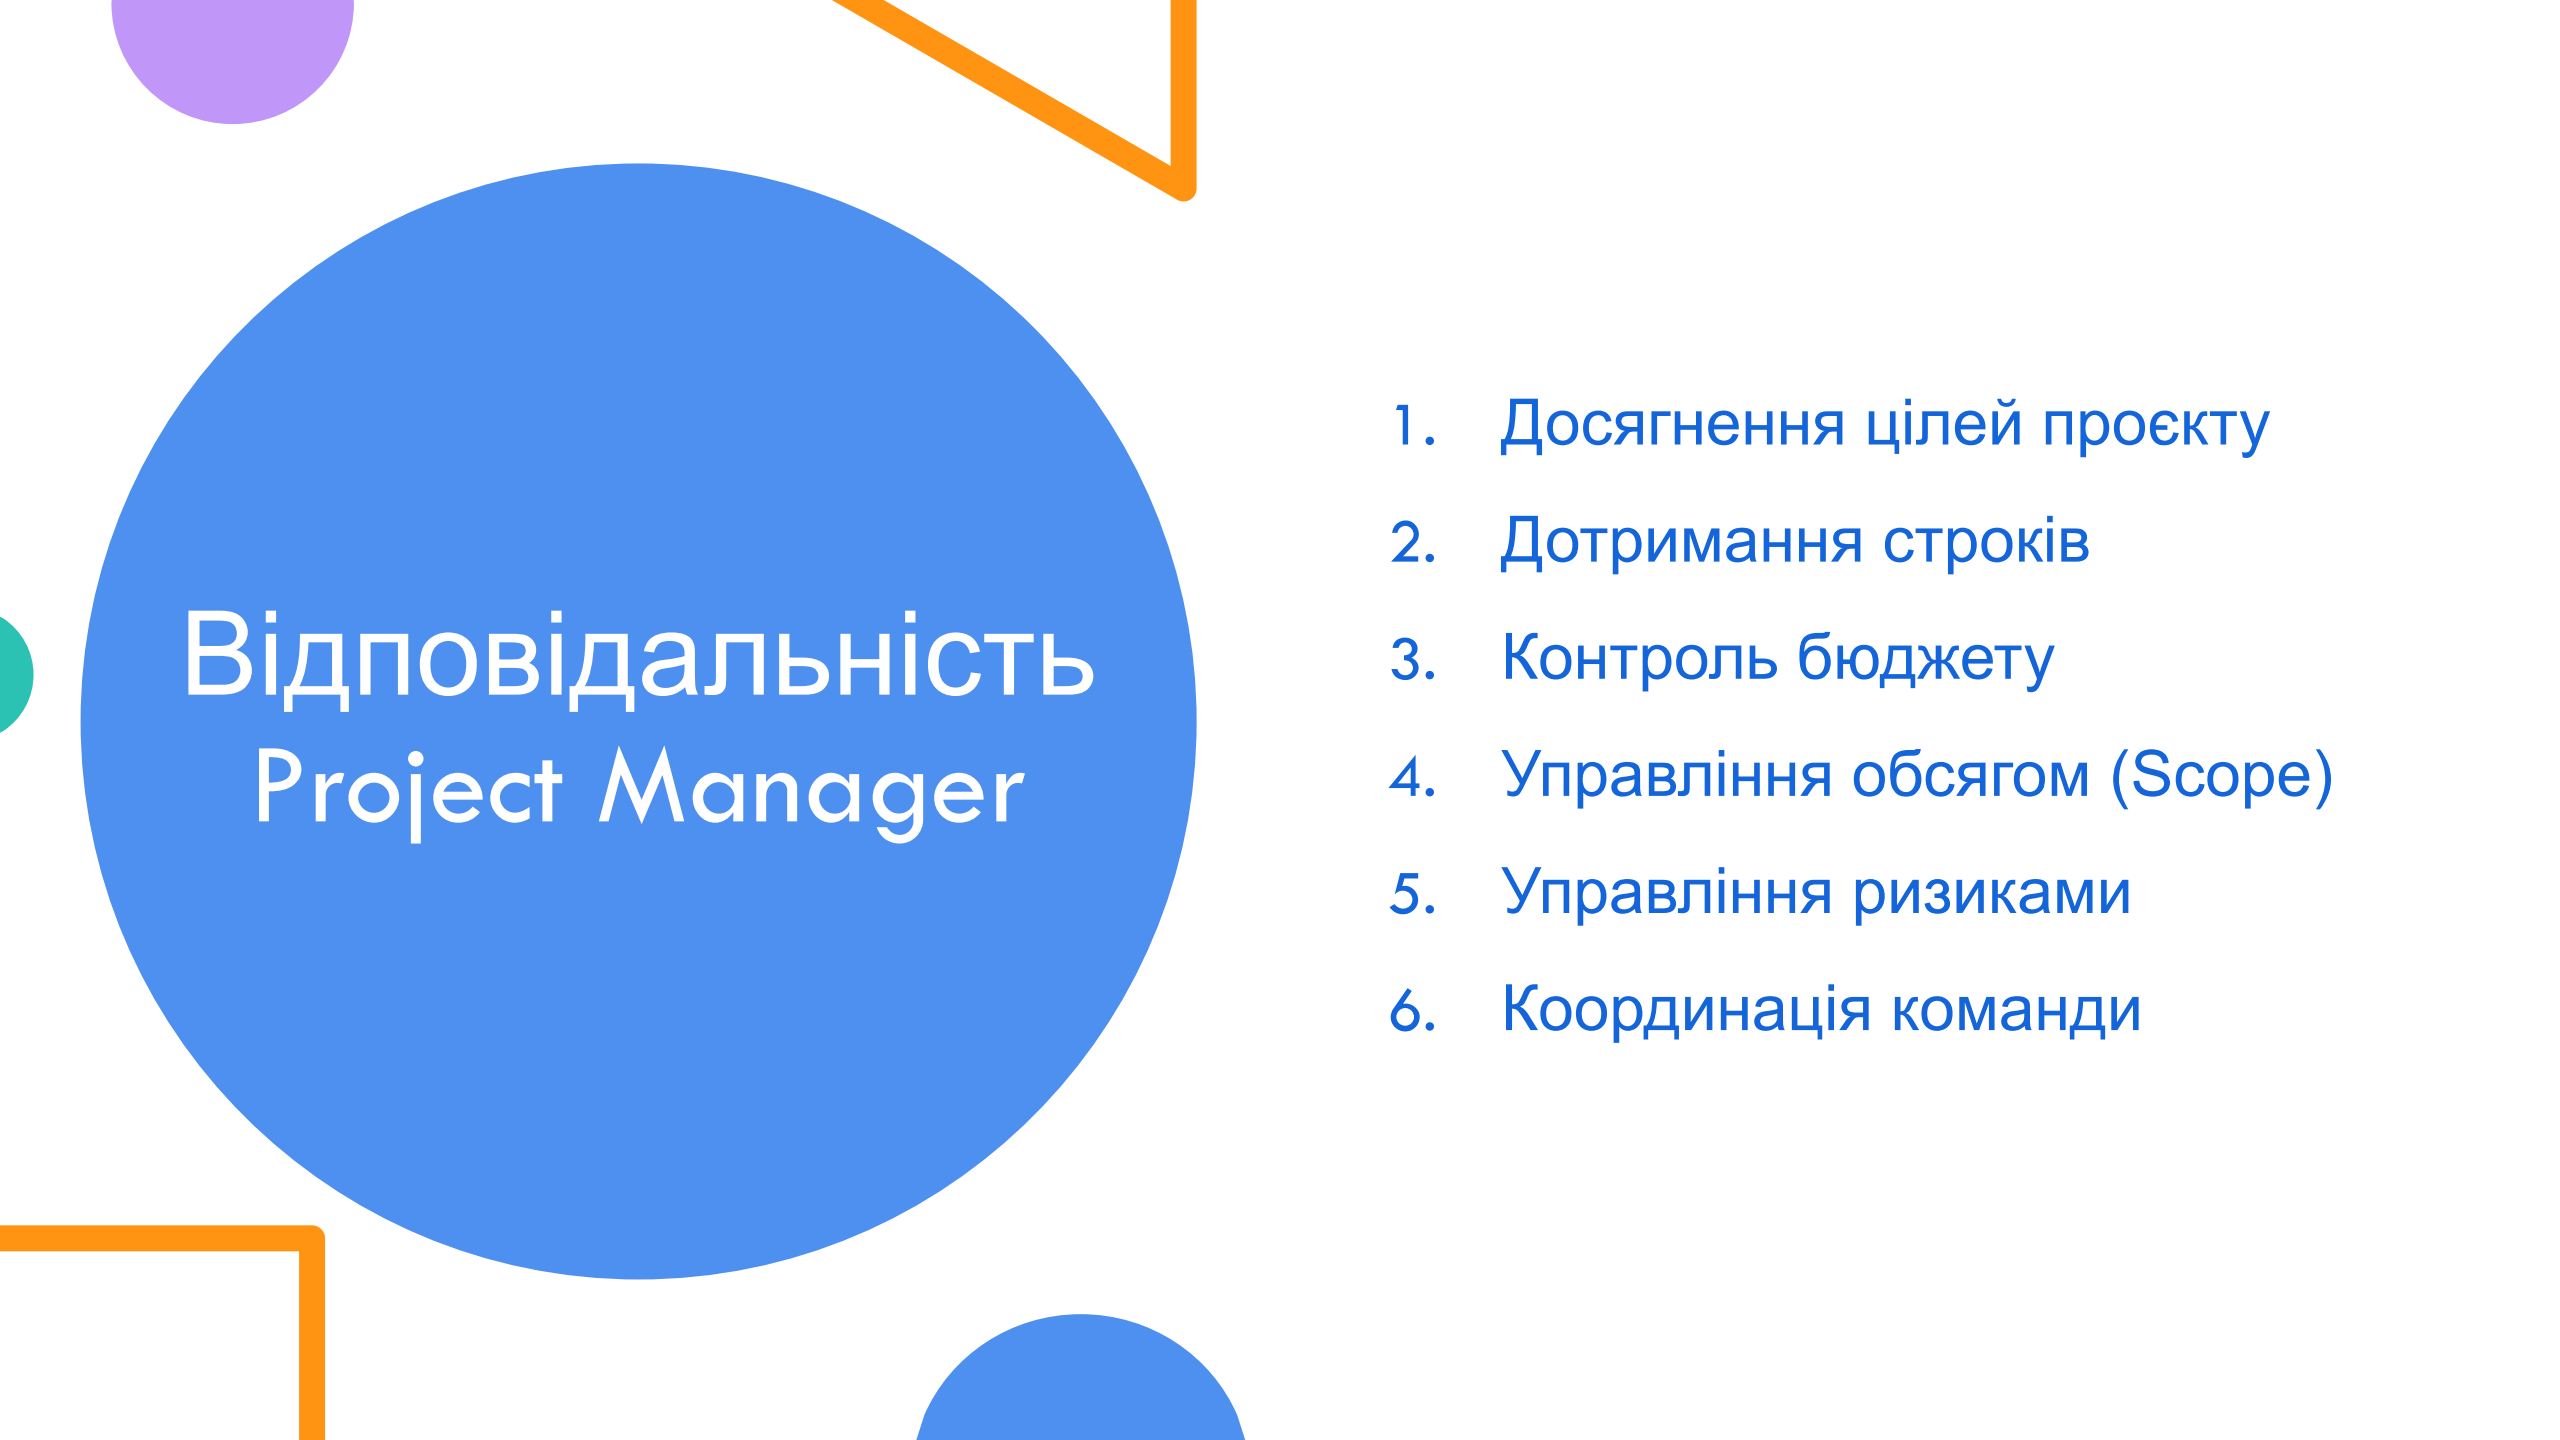


Відповідальність Project Manager

1. Досягнення цілей проєкту
2. Дотримання строків
3. Контроль бюджету
4. Управління обсягом (Scope)
5. Управління ризиками
6. Координація команди

Робочий день проєктного менеджера в ІТ може виглядати так:

- Переглянути план задач на поточний день.
- Перевірити пошту та месенджери, щоб не пропустити важливі повідомлення від клієнтів в інших частинах світу.
- Провести регулярні ранкові зустрічі або дзвінки з командами, де члени команди розкажуть, що вони зробили вчора, що планують робити сьогодні і що може заважати їх роботі.
- Провести персональні зустрічі з деякими членами команди — подібні персональні зустрічі також є регулярною активністю.
- Оновити журнали ризиків проєктів.
- Оновити проєктну документацію.
- Створити звіт за попередній тиждень та відправити його керівництву.
- Брейнштурмінг з технічним лідером команди, як саме можна покращити ефективність проєкту.
- Створити план задач для себе на наступний день.

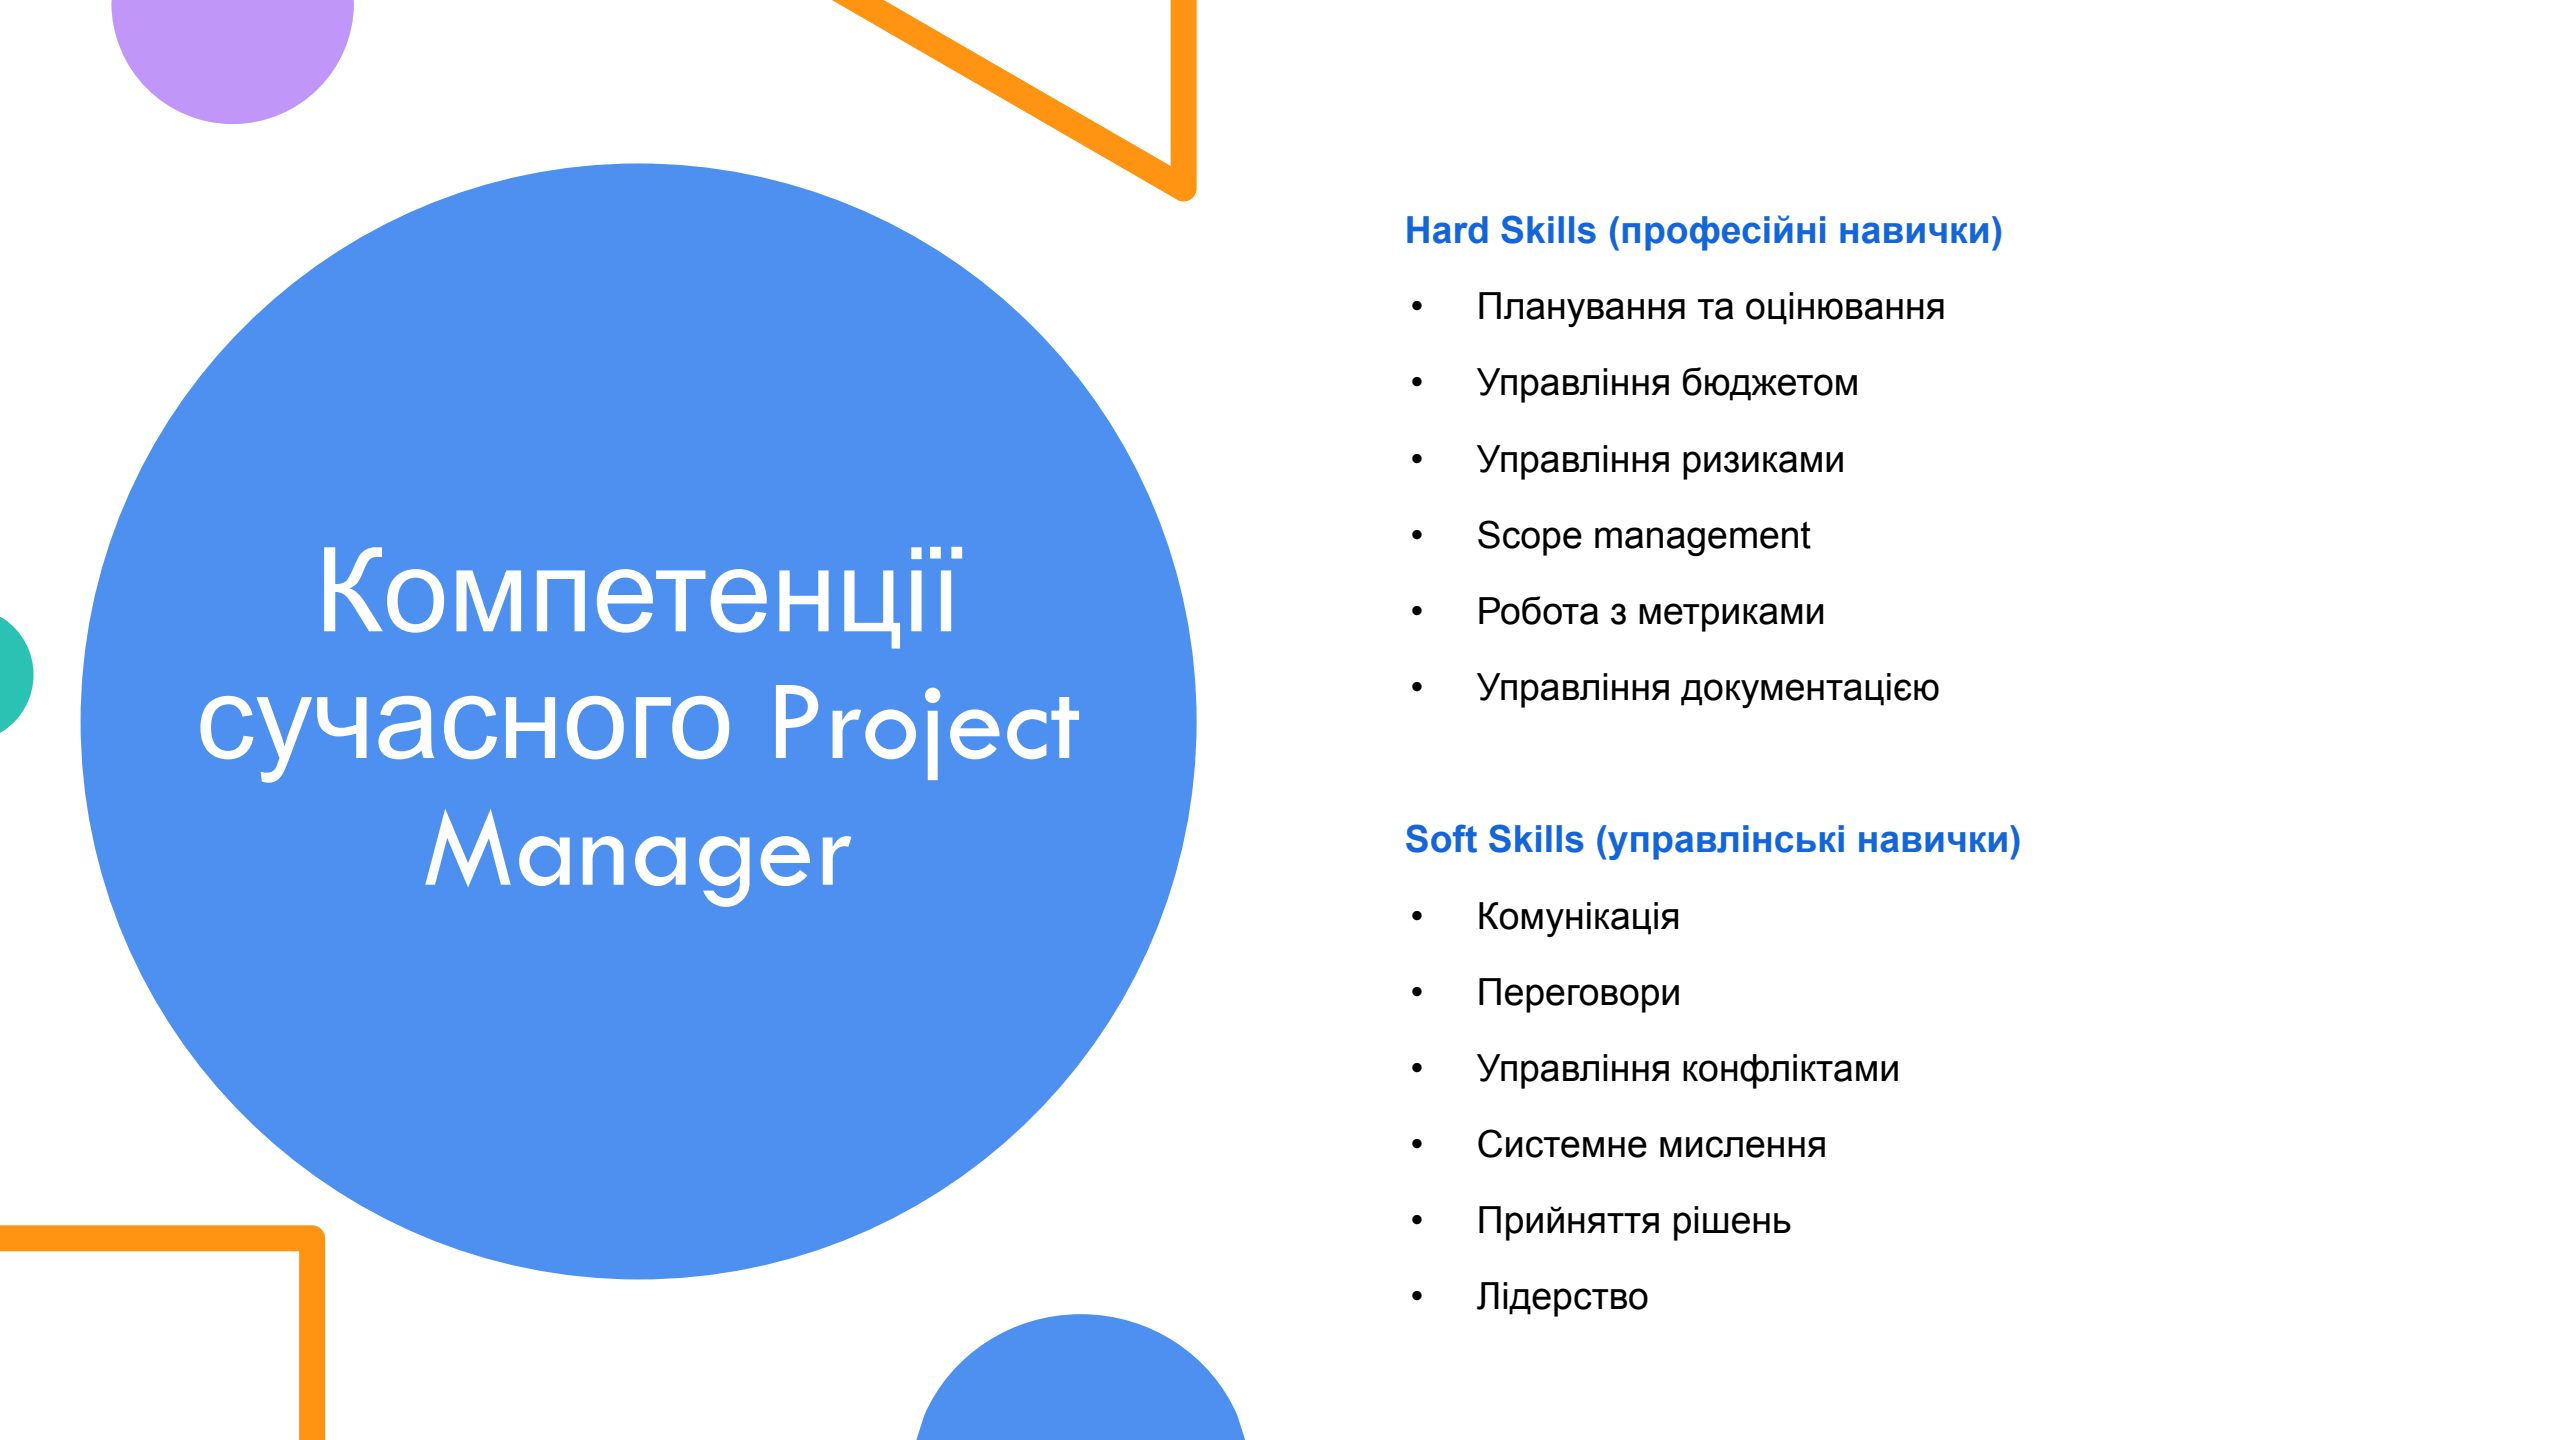

Компетенції сучасного Project Manager

Hard Skills (професійні навички)

- Планування та оцінювання
- Управління бюджетом
- Управління ризиками
- Scope management
- Робота з метриками
- Управління документацією

Soft Skills (управлінські навички)

- Комунікація
- Переговори
- Управління конфліктами
- Системне мислення
- Прийняття рішень
- Лідерство
